



जिल्ला समन्वय समिति, दाङद्वारा आयोजित

आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को वार्षिक समिक्षा गोष्ठिमा

सडक डिभिजन दाङद्वारा
प्रस्तुत गरिएको

वार्षिक कार्य प्रगति प्रतिवेदन

प्रस्तुतकर्ता:-

ई.गुरुप्रसाद अधिकारी
डिभिजन प्रमुख (रा.प. द्वितीय श्रेणी)
सडक डिभिजन दाङ

आ.व. २०८०/०८१ को कूल बजेटको अवस्था:-

रकम रु. हजारमा

सि.नं.	शिर्षक	अख्तियारी रकम	खर्च रकम	खर्च प्रतिशत	फ्रिज रकम	फ्रिज प्रतिशत
१	कार्यक्रम बजेट (पुँजिगत बजेट)	१३०७३१५	१०८४५४६.४७	८२.९५	२२२७६८.५३	१७.०४
२	संचालन खर्च बजेट (चालु बजेट)	१९१००	१८८८३.५३	९८.८६	२१६.४७	१.१४
	जम्मा	१३२६४१५	११०३४३०	८३.१८	२२२९८५	१६.८१

आ.व. २०८०/८१ का सम्पादन गरिएका कार्यक्रमहरु र बजेटको विवरण:- ११ वटा

रकम रु. हजारमा

सि.नं.	कार्यक्रमको नाम	अख्तियारी रकम (विनियोजित बजेट)	कार्यक्रमको भौतिक प्रगति प्रतिशत	वित्तिय प्रगति प्रतिशत	फ्रिज भएको	
					रकम	प्रतिशत
१	३३७०११०८ (मदन भण्डारी राजमार्ग बाहुनडागी देखि रुपालसम्म)	५००००		१००	०	०
२	३३७०११३८ राजमार्ग स्तरउन्नती तथा पुनरस्थापना कार्यक्रम	४२०००	६१	५८.९५	१७२४१	४१.०५
३	३३७०११६९ वैकल्पिक सहायक राजमार्ग विकास कार्यक्रम	२१८९७८	९०	८९.०१	२४०६१	१०.९९
४	३३७०११७६ निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक सडक	३१५८१५	९०	८५.८०	४४८५४	१४.०२
५	३३७०११७७ राप्ती लोकमार्ग	३२००००	६५.७८	६५.७८	१०९४८९	३४.२२
६	३३७०११२२ स्थानीय सडक पुल निर्माण	६५७००	९७	९६.५३	२२८१	३.४७
७	३३७०११३२ रणनीतिक सडक पुल निर्माण तथा पुल पुलेसा संरक्षण	३९००	१.९५	१.९५	३८२४	९८.०५
८	३७०१०११३ सडक बोर्ड	२२८२१२	९०.८०	९०.८०	२१०००	९.२०
९	३३७०१०१२३	१९१००	९८.८६	९८.८६	२१७	१.१४
१०	३३७०१०१२४	१०००	१००	९८.९०	११	१.१
११	३३७०१०११४	६१७१०	१००	९९.९९	७	०.०१

आ.व. २०८०/८१ मा कार्यक्रमबाट प्राप्त भएका उपलब्धिहरुको विवरण:-

सि.नं.	कार्यक्रमको नाम	प्राप्त गरिएको/भएको उपलब्धि/नतिजा/प्रगतिको			कैफियत
		सूचक/विषय	ईकाई	परिमाण	
१	३३७०११०८ (मदन भण्डारी राजमार्ग बाहुनडागी देखि रुपालसम्म)	कालोपत्रे	कि.मी.	३	
२	३३७०११३८ राजमार्ग स्तरोन्नती तथा पुनरस्थापना कार्यक्रम	सडक स्तरोन्नती	कि.मी.	३.७५	
३	३३७०११६९ वैकल्पिक सहायक राजमार्ग विकास कार्यक्रम	कालोपत्रे	कि.मी.	५.४	
		नयाँ ट्रयाक निर्माण	कि.मी.	६.५	
४	३३७०११७६ निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक सडक	कालोपत्रे	कि.मी.	७	
५	३३७०११७७ राप्ती लोकमार्ग	स्तरोन्नती	कि.मी.	७.६	
६	३३७०११२२ स्थानीय सडक पुल निर्माण	पुल निर्माण	वटा	२	
७	३३७०११३२ रणनीतिक सडक पुल निर्माण तथा पुल पुलेसा संरक्षण	पुल निर्माण	वटा	०	
८	३७०१०११३ सडक बोर्ड	नियमित मर्मत	कि.मी.	४३७	
		पटके मर्मत	वर्गमिटर	५९८९२	
		कालोपत्रे	कि.मी.	२.३	
		आवधिक मर्मत	कि.मी.	२८.८	
		नयाँ ट्रयाक निर्माण	कि.मी.	१५.७	

कार्यालयको उद्देश्य र कार्य जिम्मेवारी भित्र पर्ने विषय (सूचक) हरुको जिल्लाको तथ्यांकित अवस्था:-

सि.नं.	सूचक/विषय/शिर्षक	ईकाई	आ.व. २०८०/०८१ मा प्राप्त गरिएको/भएको/नतिजा/उपलब्धि/प्रगति परिमाण	हालसम्मको जिल्लाको अवस्था परिमाण	कैफियत
१	नियमित मर्मत संभार	कि.मि.	४३७	४३७	
२	पटके मर्मत संभार	वर्गमिटर	५९८९२.८१	५९८९२	
३	आवधिक मर्मत संधार	कि.मि.	३१	२९	

वेरुजु फछ्यौटको प्रगति अवस्था:-

रकम रु. हजारमा

सि.नं.	वेरुजुको किसिम	आ.व. २०७९/०८० को	हालसम्मको जम्मा वेरुजु	आ.श. २०८०/८१ मा गरिएको	
				फछ्यौट रकम	फछ्यौट प्रतिशत
१	पेशकी वेरुजु	०	१३९१३६.४६	९७४४६.४६	७०.०३
२	नियमित गर्नुपर्ने वेरुजु	११९२६.६५	१४८४७४.८३	१११६८.७१	७.५२
३	असुलउपर गर्नुपर्ने वेरुजु	७९७४५.७४	३०५२६०.७७	४३५३४.७५	१४.२६
४	जम्मा वेरुजु	९१६७२.३९	५९२८७२.०६	१५२१४९.९२	२५.६६

आ.व. २०८०/०८१ मा सम्पादन गरिएका अनुकरणीय/उल्लेखनिय कार्यहरु:-

सि.नं.	अनुकरणीय/उल्लेखनिय कार्य/शिर्षक	सूचक/ईकाई	उपलब्धि/नतिजा/परिमाण	कैफियत
१	पुल निर्माण	वटा	२	शारदा नदी पुल सल्यान र चिरेगाड खोला पुल दाङ
२	कालोपत्रे	कि.मि.	१७.७	मार्के - कालिमाटी, खैराबाड मन्दिर जाने सडक सल्यान, छाँयाक्षेत्र जाने सडक तथा अन्य वैकल्पिक सहायक राजमार्ग अन्तर्गतका निर्माण कार्यहरु
३	आवधिक मर्मत	कि.मि.	२८.८	भालुवाड - गनाहा, अर्जुनखोला - वेलभार र श्रीनगर - खलङ्गा
४	पटके मर्मत	कि.मि.	३०	कुइरेपानी - घोराही - तुलसीपुर सडक खण्ड
५	जग्गा संरक्षण	विघा-कठ्ठा-धुर	६-६-५	लमही नगरपालिका डा नं. ५ स्थित जग्गा यस डिभिजनको नाममा श्रेस्ता कायम गरी पुर्जा प्राप्त गरिएको
६	अनाधिकृत होडिङ्ग बोर्ड हटाइएको	थान	३८५	धानखोला-शिवखोला सडक खण्डमा

आ.व. २०८०/०८१ मा भोगिएका समस्याहरु/कार्यालयका विद्यमान समस्याहरु:-

सि.नं.	मूख्य मूख्य समस्याका बुँदाहरु
१	वन क्षेत्रभित्रका सडकहरु समेत कार्यान्वयन गर्नुपरेको
२	बिजुली पोल लगायत अन्य Utilities स्थानान्तरणमा समस्या
३	अनुमती विना राष्ट्रिय राजमार्गसँग जोडिएर सहायक बाटो निर्माणले उत्पन्न समस्या
४	प्रभावकारी अन्तरनिकाय समन्वय

कार्यालयका (संघ सरकार, प्रदेश सरकार र जि.स.स.) सँगका अपेक्षाहरू:-

सि.नं.	अपेक्षा गरिएका विषय/व्यहोरा	अपेक्षा गरिएको नियका	उपलब्धि/नतिजा/परिमाण
		कुन निकायसँग	कहिले सम्म
१	Need Based बजेट प्राप्त हुनुपर्ने	सडक विभाग	निरन्तर
२	अन्तरनिकाय समन्वय	जि.स.स., स्थानीय तह, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र अन्य कार्यालयहरू	निरन्तर

कार्यालयको आ.व. २०८१/०८२ मा वा त्यो भन्दा पछाडिको भावी कार्यक्रम/लक्ष्य/सौच:-

सि.नं.	सौच/लक्ष्य/कार्यक्रम	यसबाट प्राप्त हुने अपेक्षित नतिजा/उपलब्धिका			कहिले सम्मको
		अपेक्षित नतिजाको सूचक	ईकाई	परिमाण	
१	सडक मर्मत संभार	पटके मर्मत	कि.मि.	१८४.३	
		नियमित मर्मत संभार	कि.मि.	४७७.४२	
२	स्थानीय सडक पुल निर्माण	पुल निर्माण	वटा	३	२०८२ बैशाख मसान्त
३	सडक स्तरोन्नती	कालोपत्रे	कि.मि.	१५	
४	निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक सडक	कालोपत्रे	कि.मि.	८	

महत्वपूर्ण तस्विरका झलकहरु:-






(शारदा नदी पुल, राप्ती राजमार्गको चेनेज ७२+५०० देखि शंखमुल छत्रेश्वरी जाने सडकमा)



(राप्ती राजमार्गको चेनेज १३+१०० मा Asphalt प्रविधिबाट हुँदै गरेको राजमार्ग स्तरोन्नती कार्य)

महत्वपूर्ण तस्विरका झलकहरु:-

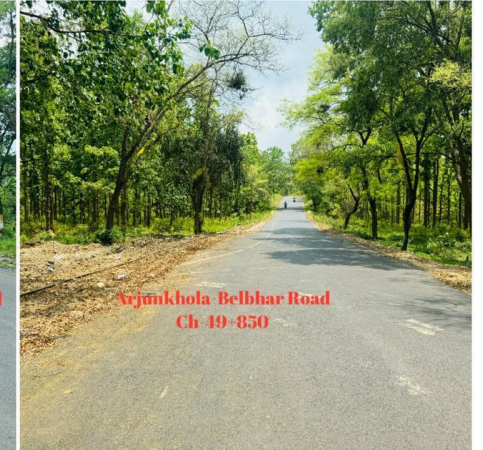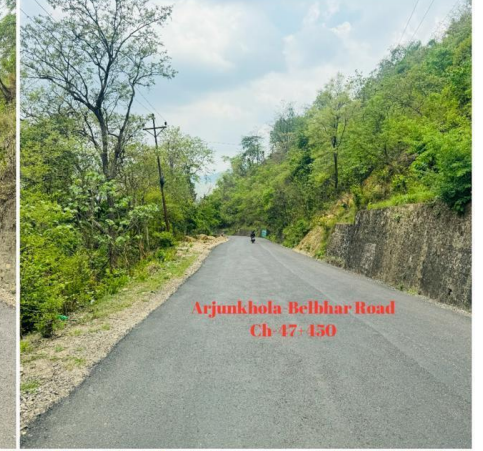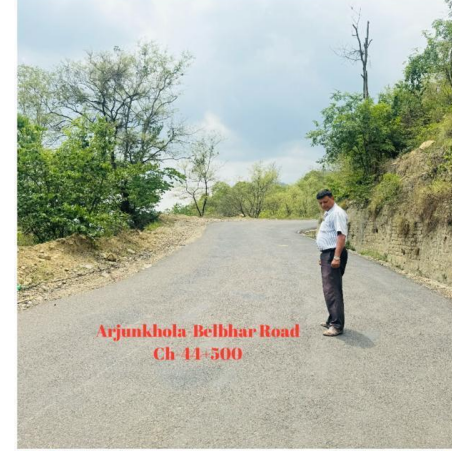

(भालुवाङ - गनाहा (चेनेज ०+००० देखि ८+००० सम्म) सडकमा
आवधिक मर्मत कार्य)

(लमही - घोराही (चेनेज ३६+५०० देखि ५०+३००) सडकको
आवधिक मर्मत कार्य)

महत्वपूर्ण तस्विरका झलकहरु:-



(बबई गाउँपालिका अन्तर्गत पर्ने श्रीमणी मार्गको चेनेज ४+५०० मा भएको Rigid Pavement कार्य)

2024-08-23



(खलङ्गा - कालिमाटी - मार्के सडकको चेनेज २+८०० मा भएको DBST कार्य)

13

જિજ્ઞાસા ?

ધન્યવાદ
